

**REPUBLIQUE DU NIGER**

**CABINET DU PREMIER MINISTRE**

**AGENCE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP)**



**RAPPORT SUR L'AUDIT PHYSIQUE DES MARCHES PUBLICS**

**Août 2015**

**Marché N°002/LOT 2\_/2014 DU 07 janvier 2015**

**FINANCEMENT : BUDGET NATIONAL**

	Document de travail	Dates
	Version provisoire	24.04.2015
X	Version définitive	28.08.2015

**GROUPE BEC**

02 BP 8063 Cotonou (Bénin) Tél (229)21.30.54.22

06 BP 60535 Lomé (Togo) Tél (228)22 20 15 72

E-mail : bec\_scp@yahoo.fr /mensexpert@yahoo.fr

**Sommaire :**

<b>SIGLES ET ABREVIATIONS .....</b>	<b>4</b>
<b>PREAMBULE .....</b>	<b>5</b>
<b>AVANT-PROPOS .....</b>	<b>5</b>
<b>CONTENU DU RAPPORT.....</b>	<b>5</b>
<b>I. LETTRE INTRODUCTIVE.....</b>	<b>6</b>
<b>II. RESUME EXECUTIF .....</b>	<b>7</b>
<b>III. CONTEXTE.....</b>	<b>9</b>
<b>IV. OBJECTIFS DE LA MISSION.....</b>	<b>10</b>
4.1. OBJECTIF GENERAL .....	10
4.2. OBJECTIFS SPECIFIQUES.....	10
<b>V. METHODOLOGIE DE REALISATION DE LA MISSION ET DILIGENCES MISES EN OEUVRE .....</b>	<b>11</b>
5.1. PHASE DE PREPARATION.....	11
5.2. PHASE D’ECHANTILLONNAGE .....	11
5.3. VISITES DES SITES.....	12
5.4. PHASE DE SYNTHESE ET DE REDACTION DE RAPPORT .....	13
<b>VI. RESULTATS DE L’AUDIT DE L’EXECUTION PHYSIQUE DES MARCHES PAR AUTORITE CONTRACTANTE.....</b>	<b>14</b>
6.1. DIRECTION REGIONALE DE L’URBANISME DE DOSSO.....	14
6.1.1. Consistance des travaux du marché.....	14
6.1.2. Constats.....	14
6.1.2.1. Matérialités des dépenses effectuées .....	14
6.1.2.2. Etat des ouvrages.....	15
6.1.2.3. Conformité des ouvrages par rapport aux normes techniques.....	18
6.1.2.4. Conformité de réception des ouvrages dans le délai de garantie.....	19
6.1.2.5. Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par rapport aux consultations .....	19
6.1.2.6. Justification technique et financière des avenants et ordres de missions .....	20
6.1.3. Synthèse des constats et conclusion.....	21
6.2. DIRECTION REGIONALE DE L’HYDRAULIQUE DE DOSSO.....	22
6.2.1. Consistance des travaux du marché.....	22
6.2.2. Constats.....	22
6.2.2.1. Matérialités des dépenses effectuées .....	22
6.2.2.2. Etat des ouvrages.....	22
6.2.2.3. Conformité des ouvrages par rapport aux normes techniques.....	23
6.2.2.4. Conformité de réception des ouvrages dans le délai de garantie.....	23

6.2.2.5. Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par rapport aux consultations .....	24
6.2.2.6. Justification technique et financière des avenants et ordres de missions.....	24
6.2.3. Synthèse des constats et conclusion.....	24
6.3. DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE DE DOSSO.....	25
6.3.1. Consistance des travaux du marché.....	25
6.3.2. Constats.....	25
6.3.2.1. Matérialités des dépenses effectuées .....	25
6.3.2.2. Etat des ouvrages.....	25
6.3.2.3. Conformité des ouvrages par rapport aux normes techniques.....	26
6.3.2.4. Conformité de réception des ouvrages dans le délai de garantie.....	26
6.3.2.5. Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par rapport aux consultations .....	27
6.3.2.6. Justification technique et financière des avenants et ordres de missions.....	27
6.3.3. Synthèse des constats et conclusion.....	27
6.4. DIRECTION REGIONALE DE L'EQUIPEMENT DE DOSSO .....	28
6.4.1. Consistance des travaux du marché.....	28
6.4.2. Constats.....	28
6.4.2.1. Matérialités des dépenses effectuées .....	28
6.4.2.2. Etat des ouvrages.....	28
6.4.2.3. Conformité des ouvrages par rapport aux normes techniques.....	29
6.4.2.4. Conformité de réception des ouvrages dans le délai de garantie.....	29
6.4.2.5. Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par rapport aux consultations .....	30
6.4.3. Synthèse des constats et conclusion.....	30
6.5. DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE DE MARADI .....	31
6.5.1. Consistance des travaux du marché.....	31
6.5.2. Constats.....	32
6.5.2.1. Matérialités des dépenses effectuées .....	32
6.5.2.2. Etat des ouvrages.....	33
6.5.2.3. Conformité des ouvrages par rapport aux normes techniques.....	36
6.5.2.4. Conformité de réception des ouvrages dans le délai de garantie.....	36
6.5.2.5. Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par rapport aux consultations .....	37
6.5.3. Synthèse des constats et conclusion.....	38
6.6. DIRECTION REGIONALE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES DE MARADI .....	39
6.6.1. Consistance des travaux du marché.....	39
6.6.2. Constats.....	39
6.6.2.1. Matérialités des dépenses effectuées .....	39
6.6.2.2. Etat des ouvrages.....	39
6.6.2.3. Conformité des ouvrages par rapport aux normes techniques.....	40

6.6.2.4. Conformité de réception des ouvrages dans le délai de garantie.....	40
6.6.2.5. Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par rapport aux consultations .....	41
6.6.3. Synthèse des constats et conclusion.....	41
<b>VII. ANNEXES.....</b>	<b>42</b>

### SIGLES ET ABREVIATIONS

<b>Sigles/Abréviations</b>	<b>Définitions</b>
CPTP	Cahiers des prescriptions techniques particuliers
DRUL	Direction Régionale de l'urbanisme
DRH	Direction Régionale de l'hydraulique
GAFSP	Programme Mondiale pour l'Agriculture et la sécurité Alimentaire
HT	Hors Taxes
TTC	Toutes Taxes Comprises
VTA	Ville de Tahoua

## **PREAMBULE**

### **AVANT-PROPOS**

Ce rapport est produit dans le cadre de la vérification de l'exécution physique des marchés publics passés par les autorités contractantes des régions de DOSSO et de MARADI (lot 2) au titre de la gestion budgétaire 2013 et vient compléter le rapport d'audit de conformité des procédures de passation des marchés publics élaboré séparément par le cabinet BEC Sarl.

Les contrôles physiques ont été exécutés par notre cabinet qui s'est adjoint l'expertise d'un Ingénieur Génie Civil sénior sélectionné sur la base de nos procédures qualité et dont l'indépendance a été soigneusement examinée.

### **CONTENU DU RAPPORT**

Le présent rapport aborde exclusivement le contrôle physique des contrats ou marchés passés par les autorités contractantes des régions de DOSSO et de MARADI (lot 2) au titre de la gestion budgétaire 2013.

En amont des résultats des contrôles pour chaque contrat ou marché sélectionné, un rappel des termes de références et de la méthodologie d'audit et de l'échantillonnage est effectué.

## I. LETTRE INTRODUCTIVE

Au

**Secrétariat Exécutif de l'Agence de  
Régulation des Marchés Publics (ARMP)  
BP 967 Niamey (Rép. du Niger)**

Monsieur,

Faisant suite au contrat n°002/Lot 2\_/2014 du 07 janvier 2015, et en exécution de la vérification de l'exécution physique de huit (08) marchés publics auprès de six (06) autorités contractantes des régions de DOSSO et de MARADI (lot 2) au titre de la gestion budgétaire 2013, nous avons l'honneur de vous présenter notre rapport conformément aux termes de référence.

Au cours de la mission, nous avons rencontré divers interlocuteurs au sein des autorités contractantes retenues (Cf. annexe 1). Nous les remercions pour leur disponibilité et leur collaboration tout au long de notre mission.

Notre démarche a été effectuée en accord avec les exigences des termes de référence (TDR).

Les résultats de nos travaux sont matérialisés par la présentation du présent rapport qui se décline en six (06) parties ci-après :

1. Rapport de synthèse ;
2. Contexte ;
3. Objectifs de la mission ;
4. Méthodologie et Diligences ;
5. Résultats de l'audit de l'exécution physique des marchés par autorité contractante ;
6. Annexes.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de notre parfaite collaboration.

**Niamey, le 28 août 2015**



**Serge MENSAH**

Associé-Gérant

Expert en passation des marchés

Expert-comptable diplômé

Commissaire aux comptes

## II. RAPPORT DE SYNTHESE

Au terme de l'appel d'offres international lancé par l'Agence de Régulation des Marchés Publics du Niger, le cabinet BEC Sarl a été retenu pour réaliser la mission d'audit de l'exécution physique de huit (08) marchés dans les Régions de Dosso et de Maradi au titre de la gestion budgétaire 2013.

Nous avons effectué notre mission sur la base des termes de référence et du contrat n°002/Lot 2\_/2014 du 07 janvier 2015, signé entre l'ARMP et le Cabinet BEC Sarl.

Pour atteindre les objectifs qui nous sont assignés par les termes de référence et le contrat de services, nous avons adopté la méthodologie ci-après :

- ✓ la phase de préparation ;
- ✓ l'échantillonnage ;
- ✓ la visite de sites ;
- ✓ la rédaction du rapport.

Nos travaux se sont déroulés du **12 mars au 13 avril 2015** sur les différents sites, au siège des différentes autorités contractantes retenues et au siège du cabinet.

Il est observé que l'échantillon validé représente 10% en volume (soit huit marchés) de l'échantillon retenu pour l'audit de conformité des procédures de passation des marchés.

Ces huit (08) marchés retenus sont répartis entre six (06) autorités contractantes à savoir :

- Direction Régionale de l'Hydraulique de DOSSO ;
- Direction Régionale de l'Education Nationale de DOSSO ;
- Direction Régionale de l'Equipement de DOSSO ;
- Direction Régionale de l'Urbanisme et de Logement de DOSSO ;
- Direction Régionale de l'Hydraulique de MARADI ;
- Direction Régionale de l'Enseignement Secondaire de MARADI.;

A l'issue de l'audit, les grandes conclusions faites par la mission se présentent comme suit :

### a. Direction Régionale de l'Hydraulique de DOSSO

L'examen a porté sur un (01) marché. Au terme des travaux l'audit conclut que les travaux ont été suspendus à 5% d'exécution alors que l'entreprise attributaire a perçu 30% du marché (avance de démarrage).



**b. Direction Régionale de l'Education Nationale de DOSSO**

L'examen a porté sur un (01) marché de travaux. Au terme de notre revue, l'audit conclut que les travaux sont totalement exécutés et ce dans le respect des normes techniques prévues. Cependant, il est à noter un retard dans l'exécution des travaux. La réception provisoire n'est toujours pas effectuée.

**c. Direction Régionale de l'Equipement de DOSSO**

Un (01) marché a été examiné. L'audit conclut à l'issue de cet examen, que le marché a été exécuté à 100% conformément aux normes techniques prévues. Les réceptions provisoire et définitive ont été effectuées dans le respect des délais.

**d. Direction Régionale de l'Urbanisme et de Logement de DOSSO**

Deux (02) marchés ont été examinés. A l'issue de cet examen, l'audit conclut que les travaux ont été exécutés conformément aux dispositions des cahiers de prescriptions techniques. Néanmoins quelques malfaçons ont été relevées. Il s'agit notamment :

- de la pose des pavées dans la grande cour du gouvernorat ;
- de la modification de plan de portail d'entrée ;
- des problèmes d'étanchéité & menuiseries.

**e. Direction Régionale de l'Hydraulique de MARADI**

L'examen a porté sur deux (02) marchés. Il en ressort que les travaux sont toujours en cours ; d'énormes retards ont été constatés. En ce qui concerne le chantier de muni-AEP, les normes techniques prévues n'ont pas été respectées.

**f. Direction Régionale de l'Enseignement Secondaire de MARADI**

Les contrôles ont porté sur un (01) marché. A l'issue des diligences mises en œuvre, l'audit a conclu que les travaux ont été exécutés à 100% conformément aux prescriptions techniques prévues.

### III. CONTEXTE

Le Gouvernement du Niger pour garantir la transparence, l'équité et l'efficacité de son système des marchés publics a procédé à d'importantes réformes dont les aboutissements sont notamment la mise en place d'une Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) dont l'une des missions principales est le contrôle à posteriori des procédures des marchés publics et des délégations de service public.

Entité indépendante, l'ARMP du Niger joue un rôle de régulateur du système des marchés publics nigériens. A cet effet, l'article n°8 de la Loi 2011-37 du 28 octobre 2011 portant principes généraux, contrôle et régulation des Marchés Publics et des Délégations de service public lui confère un certain nombre de prérogatives parmi lesquelles se trouvent la réalisation à la fin de chaque gestion budgétaire, d'un audit indépendant en vue de contrôler et de suivre la mise en œuvre de la réglementation en matière de passation, d'exécution et de contrôle des marchés publics et des délégations de service public.

C'est l'objet de la présente mission qui concerne la mise en œuvre de l'évaluation de la conformité, vis-à-vis de la réglementation, des procédures de passation et d'exécution des marchés conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année budgétaire 2013.

## IV. OBJECTIFS DE LA MISSION

### 4.1. Objectif général

La mission a pour objectif principal la vérification de l'exécution physique ou technique des marchés publics passés par les autorités contractantes au titre de l'exercice 2013 ; qu'ils soient de travaux, fournitures, de services, et de prestations intellectuelles (en excluant les contrats non éligibles au contrôle physique); en vue de s'assurer de la conformité technique et la qualité des prestations réalisées par rapport aux normes techniques.

### 4.2. Objectifs spécifiques

Il s'agit pour les consultants d'apprécier la conformité de la réception de la livraison des biens, équipements, fournitures ou des travaux avec les PV de réception provisoire ou définitive ; et surtout le caractère probant des rapports de contrôle des bureaux d'étude par rapport aux constatations physiques faites sur site. De façon détaillée, la mission comprend les objectifs spécifiques suivants :

- ✓ vérifier la conformité des fournitures ou la conformité physique des travaux réalisés par rapport aux normes techniques d'une part et d'autre part par rapport aux prescriptions techniques des contrats et aux procès-verbaux de réception ;
- ✓ s'assurer de la qualité, véracité et sincérité des documents de Contrôle par rapport aux constatations physiques faites sur le terrain ;
- ✓ apprécier l'état de fonctionnement des ouvrages ;
- ✓ vérifier la cohérence des quantités et des prix unitaires pratiqués pour les principales rubriques par rapport à ceux du marché pour les travaux ;
- ✓ vérifier la cohérence entre les quantités ou spécifications commandées à ceux livrés pour les fournitures ;
- ✓ apprécier le degré de mise en œuvre par les organes concernés des marchés publics des recommandations issues des rapports d'audit annuel des marchés publics portant sur les exercices budgétaires 2011 ou 2012 et du respect des feuilles des routes y afférentes.

## V. METHODOLOGIE DE REALISATION DE LA MISSION ET DILIGENCES MISES EN OEUVRE

L'audit a été réalisé en conformité avec les Termes de Références. La méthodologie adoptée pour la réalisation de l'audit technique consiste à la réalisation d'activités en quatre phases :

- ✓ la phase de préparation ;
- ✓ l'échantillonnage ;
- ✓ la visite de sites ;
- ✓ la rédaction du rapport.

Pour atteindre les objectifs fixés, nous avons mis en œuvre les diligences ci-après :

### 5.1. Phase de préparation

Après la signature du contrat, nous avons été invités suivant l'ordre de service n°026/SE/ARMP/SAF du 20 janvier 2015 à démarrer la mission. Nous avons tenu une réunion de briefing avec le Secrétariat Exécutif de l'ARMP, au cours de laquelle des informations ont été échangées et les préoccupations des uns et des autres précisées.

Cette rencontre a permis de collecter les informations et les documents nécessaires au bon déroulement de la mission et de faire la revue documentaire. Ladite revue a porté sur les documents ci-après :

- ✓ Données générales sur les marchés;
- ✓ Les cahiers des prescriptions techniques et termes de références pour les travaux et prestations intellectuelles;
- ✓ Les documents de gestion financière et administrative des projets : décomptes, ordres de services, avenants;
- ✓ Les documents de suivi et contrôle des travaux : rapports d'essais, procès-verbaux de réception, rapports périodiques ;
- ✓ Toute autre documentation utile à la mission.

### 5.2. Phase d'échantillonnage

La sélection a été effectuée sur la base de l'échantillonnage des marchés devant faire l'objet d'audit de conformité, dans lequel sont extraits des marchés ou prestations à effets non traçables (reprofilage, désherbage, nettoyage, etc.).

Ensuite, nous avons retenu un échantillon de marchés représentant 10% en volume de l'échantillon pour l'audit de conformité.

A la suite de cette diligence, l'échantillon des marchés pour l'audit de matérialité de l'exécution physique se présente en annexe 2.

Le tableau de synthèse ci-après récapitule l'échantillon des marchés devant faire l'objet d'audit de matérialité :

*Tableau n°01 : Répartition de l'échantillon retenu pour l'audit de matérialité par autorité contractante et par région*

<b>Autorité contractante</b>	<b>Volume</b>	<b>Montant</b>
<b>DOSSO</b>		
DRH/DO	1	260 663 911
DRUL/DO	2	95 502 425
DREN/DO	1	346 748 741
DREQ/DO	1	44 084 026
<b>MARADI</b>		
DRES/MI	1	14 061 936
DRH	2	236 440 850
<b>Total général</b>	<b>8</b>	<b>997 501 889</b>

### 5.3. Visites des sites

Cette phase a permis de visiter les différents sites des marchés sélectionnés et devant faire l'objet d'audit physique afin de s'assurer de la réalité ou de l'existence physique des travaux ou fournitures d'une part et d'autre part vérifier leur conformité avec les prescriptions techniques du contrat et les procès-verbaux de réceptions.

Les visites des sites avaient pour but d'évaluer la qualité des ouvrages réalisés et de contrôler les informations obtenues pendant la revue documentaire, notamment en ce qui concerne les caractéristiques physiques, les quantités de travaux exécutées et celles nécessaires à la pérennité des réalisations. Elles ont aussi permis de recueillir l'avis des acteurs de l'exécution des marchés, de juger de la conformité contractuelle et de la qualité des travaux achevés. Ces démarches reposaient sur une revue attentive des études et documents d'exécution permettant aussi de juger du caractère précis et complet des devis descriptifs, des devis quantitatifs ainsi que de la qualité des plans contractuels et plans d'exécution.

Les visites de sites ont également permis d'échanger avec les bénéficiaires des marchés.

#### 5.4. Phase de synthèse et de rédaction de rapport

La dernière phase a été essentiellement consacrée à l'analyse, la synthèse et l'évaluation des données recueillies ainsi qu'à la rédaction du rapport d'audit de conformité physique.

## VI. RESULTATS DE L'AUDIT DE L'EXECUTION PHYSIQUE DES MARCHES PAR AUTORITE CONTRACTANTE

### 6.1. DIRECTION REGIONALE DE L'URBANISME DE DOSSO

L'audit technique pour cette autorité contractante a porté sur les deux marchés ci-après :

- ✓ **Marché n° : 03/13/GRD/DRUL (Réhabilitation du gouvernorat)**
- ✓ **Marché n° : 01/2013/GRD/DRUL (Construction des bureaux et services)**

#### 6.1.1. Consistance des travaux du marché

<b>Marché n°:</b>	<b>03/13/GRD/DRUL (Réhabilitation du gouvernorat)</b>
<b>Montant du marché</b>	<b>46.792.454</b>
<b>Attributaire</b>	<b>HYBAT</b>
<b>Les composantes du marché</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ La toiture du bâtiment principal ;</li> <li>✓ Les peintures des murs intérieurs et extérieurs ;</li> <li>✓ La réhabilitation du portail du Gouvernorat ;</li> <li>✓ Les murs de clôtures ;</li> <li>✓ Le remblai de la cour du bâtiment annexe</li> </ul>

<b>Marché n°:</b>	<b>01/2013/GRD/DRUL (Construction des bureaux et services)</b>
<b>Montant du marché</b>	<b>48.709.971</b>
<b>Attributaire</b>	<b>Issoufou Abdou</b>
<b>Les composantes du marché</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ bâtiment principal (bureaux et services) ;</li> <li>✓ La case gardien (avenant) ;</li> </ul>

#### 6.1.2. Constats

##### 6.1.2.1. Matérialités des dépenses effectuées

Les dépenses à effectuer dans le cadre des travaux sont relatives à la réhabilitation du gouvernorat et à la construction des bureaux & services de la direction de la formation professionnelle et de l'emploi. La partie exécutée des travaux et auditée par le consultant se décompose de la manière suivante :

N°	Désignation du marché	Montant du marché	Partie exécutée du marché	Travaux complémentaires	Travaux Total exécutés
1	Réhabilitation du gouvernorat	37 901 888	37 901 888	-	37 901 888
2	Construction des bureaux et services	38064405	38064405	9 007 897	47 072 302
	TOTAL HT	75 966 293	75 966 293	9 007 897	84 974 190

Les détails indiquant les quantités de travaux nécessaires et celles prévues au marché sont présentés en annexes.

#### 6.1.2.2. Etat des ouvrages


##### **Marché de réhabilitation du gouvernorat de Dosso:**

Il a été constaté que les ouvrages sont en état d'exploitation. Par ailleurs la réception provisoire de ces travaux a été prononcée.

Sous la conduite du Directeur Régionale de l'Urbanisme et du Logement, nous avons visité le chantier de réhabilitation du gouvernorat. Les ouvrages photographiés se présentent comme suit :



**Le bâtiment principal réhabilitation**

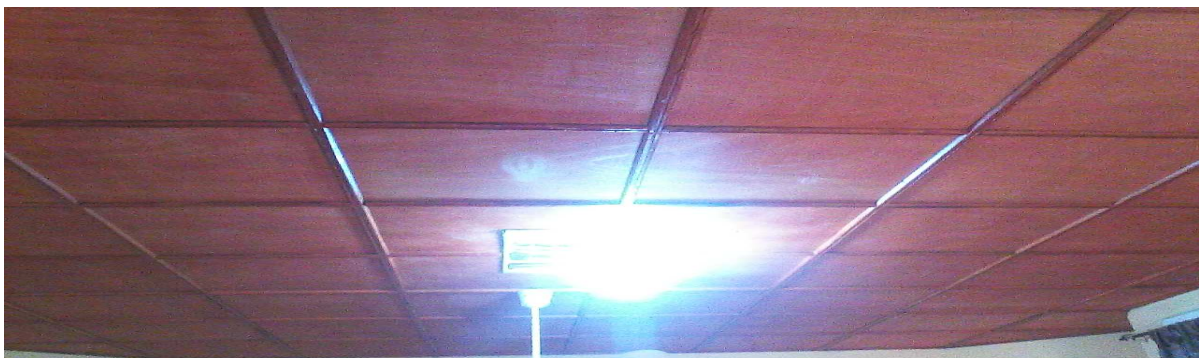

**La toiture reprise**





Peinture sur mur intérieur



Pavage de la cour du gouvernorat



Remblai de la cour



travaux de construction du portail

**Marché de construction des bureaux et services de la direction de la formation professionnelle et de l'emploi :**

La réception provisoire de l'ouvrage a été prononcée. Ce dernier est en attente d'exploitation.

Sous la conduite du Directeur Régionale de l'Urbanisme et du Logement, nous avons visité le chantier de réhabilitation du gouvernorat. Les ouvrages photographiés se présentent comme suit :



**Etat de l'ouvrage à la finition**



**Interieur de l'ouvrage**



**Interieur de l'ouvrage**



**Interieur de l'ouvrage(probleme de menuiseries)**



Case gardien (avenant du marché)



intérieur case gardien



Intérieur de la pièce (case gardien)

### 6.1.2.3. Conformité des ouvrages par rapport aux normes techniques

#### Marché de réhabilitation du gouvernorat de Dosso :

- ✓ toutes les normes techniques décrites dans les cahiers des prestations techniques relatives aux finitions des ouvrages ont été respectées. Cependant, des malfaçons ont été constatées. Elles s'expliquent par le non-respect des techniques de pose des pavés ;
- ✓ le non-respect des plans d'exécution initiaux du portail (en arcade).

#### Marché de construction des bureaux et services de la direction de la formation professionnelle et de l'emploi de Dosso :

Toutes les normes techniques décrites dans les cahiers des prestations techniques relatives aux finitions des ouvrages ont été respectés. Toutefois, les auditeurs ont constaté des problèmes d'étanchéité de la toiture et des menuiseries (portes et fenêtres) causant ainsi des dommages sur l'ouvrage avant même son exploitation.

**6.1.2.4. Conformité de réception des ouvrages dans le délai de garantie**

Les auditeurs n'ont pas constaté à la date de leur passage, la réception définitive des travaux (le délai de garantie étant toujours en cours). Ceci s'explique par le retard d'exécution des travaux dû au non paiement de décompte à temps des prestataires.

**6.1.2.5. Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par rapport aux consultations****Marché de réhabilitation du gouvernorat de Dosso**

N°	DOCUMENT DE CONTROLE	NATURE DU CONTROLE	DISPONIBILITE	OBSERVATIONS SUR LE CONTROLE
1	Marché signé +ordre de service	Délai - Conformité avec le CPTP	Ok	Bon suivi
2	Devis estimatif et Quantitatif	Description des prestations - Quantité - Prix	Ok	Validé conforme à l'offre de soumissionnaire
3	Plans d'exécution Détaillée approuvés par l'Ingénieur Conseils	Cachet d'approbation	Ok	Bon suivi
4	Test de laboratoire et autres	Conformité avec les Normes	Ok	Bon suivi
5	PV contrôle et Réception d'ouvrage par Bureau de Contrôle	-Conformité réalisation avec les plans et prescriptions	Ok	Non-respect de plan du portail d'entrée (manque de contrôle)
6	PV réunion de chantier	-Respect des dispositions du marché	Ok	Insuffisance du contrôle

### **Marché de construction des bureaux et services de la direction régionale de la formation professionnelle**

N°	DOCUMENT DE CONTROLE	NATURE DU CONTROLE	DISPONIBILITE	OBSERVATIONS SUR LE CONTROLE
1	Marché signé +ordre de service	Délai - Conformité avec le CPTP	Ok	Bon suivi
2	Devis estimatif et Quantitatif	Description des prestations - Quantité - Prix	Ok	Validé conforme à l'offre de soumissionnaire
3	Plans d'exécution Détaillée approuvés par l'Ingénieur Conseils	Cachet d'approbation	Ok	Bon suivi
4	Test de laboratoire et autres	Conformité avec les Normes	Ok	Bon suivi
5	PV contrôle et Réception d'ouvrage par Bureau de Contrôle	-Conformité réalisation avec les plans et prescriptions	Ok	Bon suivi
6	PV réunion de chantier	-Respect des dispositions du marché	Ok	bon contrôle

#### **Observations**

L'audit a constaté des malfaçons sur l'ouvrage.

Cette situation s'explique par le manque permanent de contrôle sur le chantier.

#### **6.1.2.6. Justification technique et financière des avenants et ordres de missions**

L'avenant concerne exclusivement le marché de construction des bureaux et services de la direction de la formation professionnelle. C'est dans l'optique de doter le gardien d'une case pour la surveillance de la direction.

L'exécution physique a été effectuée conformément aux cahiers des prestations techniques (règles de l'art). Un avenant au contrat (9.007.897 F CFA HT soit 18,49%) a été signé.

Les diligences mises en œuvre nous ont permis de constater que certains travaux n'ont pas été réalisés. Il s'agit notamment de :

- menuiseries métalliques (châssis à vitrer pour porte de 90/220 ;
- châssis à vitrer pour porte de 90/120 ;
- châssis à vitrer pour porte de 120/120, portant isoplane de 80/220),
- enduits-revêtement-chape (carreaux GC de 20/20 ou 3/30, plinthe de 10cm carreaux GC) ;
- peinture-vitrierie-Miroiterie (verre double pour châssis vitre).

### **6.1.3. Synthèse des constats et conclusion**

L'examen a porté sur deux (02) marchés de la direction régionale de l'urbanisme de Dosso. De façon générale, les travaux ont été réalisés conformément aux cahiers des prescriptions techniques.

Néanmoins quelques malfaçons ont été relevées. Il s'agit notamment de :

- la pose des pavées dans la grande cour du gouvernorat ;
- la modification de plan de portail d'entrée ;
- les problèmes d'étanchéité et de menuiseries (marché de construction de la direction régionale de la formation professionnelle).

## 6.2. DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE DE DOSSO

### 6.2.1. Consistance des travaux du marché

L'audit technique pour cette autorité contractante a porté sur un seul marché ci-après :

✓ **Marché n°: 02/2013/GD/DRH/DO**

<b>Marché n°:</b>	<b>02/2013/GD/DRH/DO</b> (Construction d'un AEP multi-village avec comme centre kombiliDarey)
<b>Maitre d'ouvrage</b>	Gouvernorat de Dosso
<b>Maitre d'œuvre</b>	Direction Régionale de l'Hydraulique de Dosso
<b>Montant du marché</b>	260.663.911 FCFA
<b>Attributaire</b>	TOUTHYDRO
<b>Délai d'exécution</b>	5 mois

### 6.2.2. Constats

#### 6.2.2.1. Matérialités des dépenses effectuées

Les travaux à ce niveau, sont relatifs à la construction d'un AEP multi-village avec comme centre kombilil Darey. La partie exécutée des (travaux/fournitures) et auditée par le consultant se décompose de la manière suivante :

N°	Désignation du marché	Montant du marché	Partie exécutée du marché	Travaux complémentaires	Travaux Total exécutés
1	construction d'un AEP	211 137 768	11 091 937		11 091 937
	<b>TOTAL HT</b>	<b>211 137 768</b>	<b>11 091 937</b>	-	<b>11 091 937</b>

Les détails indiquant les quantités de travaux nécessaires et celles prévues au marché sont présentés en annexes.

#### 6.2.2.2. Etat des ouvrages

L'état des travaux d'ouvrage constaté sur le terrain ainsi qu'il suit :

- ✓ Les travaux sont à une exécution autour 5% ;
- ✓ Ces derniers ont été suspendus ;
- ✓ Le contrat a été résilié du fait de l'incapacité de l'entreprise à finaliser les travaux ;

- ✓ Attente d'une contre-expertise de l'entreprise pour relancer le marché (ci-joint les notes adressé à l'entreprise) ;

Les travaux ont porté seulement sur la réalisation des gros œuvres des 16 bornes fontaines dans les différents villages et ceux de l'abri groupe.

Voici l'état de chantier photographié ainsi qui suit :



**L'état des bornes fontaines**



**L'abri groupe le regard de BF bornes fontaines**

#### **6.2.2.3. Conformité des ouvrages par rapport aux normes techniques**

Les travaux réalisés sont conformes aux normes techniques décrites dans les cahiers de prescriptions techniques (les matériaux, les dosages, la technique de la mise œuvre).

#### **6.2.2.4. Conformité de réception des ouvrages dans le délai de garantie**

**Les travaux sont suspendus. Aucune réception n'a été faite.**



### 6.2.2.5. Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par rapport aux consultations

N°	DOCUMENT DE CONTROLE	NATURE DU CONTROLE	DISPONIBILITE	OBSERVATIONS SUR LE CONTROLE
1	Marché signé +ordre de service	Délai - Conformité avec le CPTP	OK	Bon suivi
2	Devis estimatif et Quantitatif	Description des prestations - Quantité - Prix	OK	Bon suivi
3	Plans d'exécution Détaillée approuvés par l'Ingénieur Conseils	Cachet d'approbation	Ok	Bon suivi
4	Test de laboratoire et autres	Conformité avec les Normes	Ok	Bon suivi
5	PV contrôle et Réception d'ouvrage par Bureau de Contrôle	-Conformité réalisation avec les plans et prescriptions	Ok	Bon suivi
s	PV réunion de chantier	-Respect des dispositions du marché	Non	Insuffisance de contrôle

#### Observations

Il est à noter à ce niveau le manque de volonté de l'entreprise à exécuter les travaux.

### 6.2.2.6. Justification technique et financière des avenants et ordres de missions

Aucun avenant n'a été enregistré.

### 6.2.3. Synthèse des constats et conclusion

En somme, on peut dire que ces travaux ont été suspendus à 5% d'exécution. Ceci est dû à l'incapacité de l'entreprise à exécuter les travaux. En effet, cette entreprise a perçue 30% de frais de démarrage équivalent à soixante-deux millions cinq cent quatre-vingt-quatre mille trois cent soixante-trois (62.584.373 FCFA HT) et a effectué une réalisation de dix millions cinq cent soixante-trois mille sept cent cinquante (10.563.750 FCFA HT).

### 6.3. DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE DE DOSSO

#### 6.3.1. Consistance des travaux du marché

L'audit technique pour cette autorité contractante a porté sur un seul marché ci-après :

✓ **Marché n° 01/2013/GOUV/DREN/DO**

<b>Marché n°:</b>	<b>01/2013/GOUV/DREN/DO (travaux des constructions de trois(300) salles de classes dans la région de Dosso)</b>
<b>Maitre d'ouvrage</b>	<b>Gouvernorat de Dosso</b>
<b>Maitre d'œuvre</b>	Direction Régionale de l'éducation Nationale de Dosso (DREN)
<b>Montant du marché</b>	346 480 358 F TTC
<b>Attributaire</b>	Entreprise OUMAROU ANGO ET FRERES
<b>Délai d'exécution</b>	8 mois
<b>Les composantes du marché :</b>	Le présent marché a pour objet l'exécution des travaux de construction de quatre trois(43) salles de classes réparties dans 16 sites dans la région de Dosso

#### 6.3.2. Constats

##### 6.3.2.1. Matérialités des dépenses effectuées

Les travaux à ce niveau, sont relatifs aux travaux de construction de trois cent (300) salles de classes dans la région de Dosso. La partie exécutée des travaux et auditée par le consultant se décompose de la manière suivante :

N°	Désignation du marché	Montant du marché	Partie exécutée du marché	Travaux complémentaires	Travaux Total exécutés
1	Travaux de construction 300 classes dans la Région de DOSSO	280 649 090	280 649 090		280 649 090
	TOTAL HT	280 649 090	280 649 090	-	280 649 090

Les détails indiquant les quantités de travaux nécessaires et celles prévues au marché sont présentés en annexes.

##### 6.3.2.2. Etat des ouvrages

Les ouvrages sont terminés. Ils sont en état d'attente pour la réception provisoire. Ils se présentent comme suit :



Salles de classes (école Rouga peulh)



Salles de classes (école banizoum)



Salles de classes (jardin d'enfant)

#### 6.3.2.3. Conformité des ouvrages par rapport aux normes techniques

Les travaux de finition de ce marché ont été faits conformément aux normes techniques prévues dans les CPT (dosages, les coffrages, les revêtements, les peintures, la menuiserie, la toiture, les installations). Néanmoins des malfaçons ont été constatées dans certains endroits.

#### 6.3.2.4. Conformité de réception des ouvrages dans le délai de garantie

Aucune réception n'a été faite.

### 6.3.2.5. Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par rapport aux consultations

N°	DOCUMENT DE CONTROLE	NATURE DU CONTROLE	DISPONIBILITE	OBSERVATIONS SUR LE CONTROLE
1	Marché signé + ordre de service	Délai - Conformité avec le CPTP	Oui	Bon suivi
2	Devis estimatif et Quantitatif	Description des prestations - Quantité - Prix	Oui	Bon suivi
3	Plans d'exécution Détaillée approuvés par l'Ingénieur Conseils	Cachet d'approbation	Oui	Bon suivi
4	Test de laboratoire et autres	Conformité avec les Normes	Oui	Bon suivi
5	PV contrôle et Réception d'ouvrage par Bureau de Contrôle	-Conformité réalisation avec les plans et prescriptions	Oui	Bon suivi
6	PV réunion de chantier	-Respect des dispositions du marché	Oui	Insuffisance de contrôle, vu le retard pris dans l'exécution de chantier.

#### Observations

On peut noter en générale que les travaux sont exécutés dans les règles de l'art. Cependant, nous avons relevé quelques insuffisances au niveau de la mission de contrôle sur le suivi du chantier, vu les retards enregistrés dans l'exécution des travaux.

### 6.3.2.6. Justification technique et financière des avenants et ordres de missions

Aucun avenant n'a été enregistré

### 6.3.3. Synthèse des constats et conclusion

En somme, les travaux sont exécutés totalement. Néanmoins beaucoup de retard ont été enregistrés dans l'exécution et le suivi du chantier la réception provisoire de ces travaux est toujours en attente.

## 6.4. DIRECTION REGIONALE DE L'EQUIPEMENT DE DOSSO

### 6.4.1. Consistance des travaux du marché

L'audit technique pour cette autorité contractante a porté sur un seul marché ci-après :

<b>Marché n°:</b>	<b>2013/017/G/DREq/DO (Travaux d'entretien courant campagne 2013/exécution des travaux de protection d'ouvrages sur la RN1E du PK183 au PK345 et la RN7 du PK30 au PK82</b>
<b>Maitre d'ouvrage</b>	<b>Gouvernorat de Dosso</b>
<b>Maitre d'œuvre</b>	<b>Direction Régionale de l'Equipement de Dosso (DREQ)</b>
<b>Montant du marché</b>	<b>44 084 026 TTC</b>
<b>Attributaire</b>	<b>Amadou Seyni</b>

### 6.4.2. Constats

#### 6.4.2.1. Matérialités des dépenses effectuées

Notre examen a porté sur les travaux de protection d'ouvrages sur la RN1E du PK183 au PK345 et la RN7 du PK30 au PK82. La partie exécutée des travaux et auditée par le consultant se décompose de la manière suivante :

N°	Désignation du marché	Montant du marché	Partie exécutée du marché	Travaux complémentaires	Travaux Total exécutés
1	Travaux de protection d'ouvrages sur la RN1 du PK183 au PK345 et la RN7 du PK30 au PK82	37 045 400	37 032 678		37 032 678
	<b>TOTAL HT</b>	<b>37 045 400</b>	<b>37 032 678</b>	-	<b>37 032 678</b>

Les détails indiquant les quantités de travaux nécessaires et celles prévues au marché sont présentés en annexes.

#### 6.4.2.2. Etat des ouvrages

Les travaux sont exécutés à 100%. Les ouvrages sont en exploitation, aucune malfaçon n'a été enregistrée. Les composantes des ouvrages sont :

- ✓ Perrés maçonnés aux PK274+800 931,7m<sup>2</sup> ;
- ✓ Béton cyclopéen aux PK204 et PK274+800 147 m<sup>3</sup>;
- ✓ Remblai latéritique au PK204 199,2m<sup>3</sup> ;
- ✓ Fourniture et pose des gabions au PK34 46 m<sup>3</sup>

Le chantier photographié se présente comme suit :



**Perrés maçonnés route RN1**



**Perrés maçonnés route RN1**

#### **6.4.2.3. Conformité des ouvrages par rapport aux normes techniques**

A l'issue de notre examen, nous avons constaté que les travaux sont exécutés dans le respect des normes techniques (règles de l'art) comme prescrit dans la description technique.

#### **6.4.2.4. Conformité de réception des ouvrages dans le délai de garantie**

La réception définitive des travaux a été faite (un an après la réception provisoire).

#### 6.4.2.5. Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par rapport aux consultations

N°	DOCUMENT DE CONTROLE	NATURE DU CONTROLE	DISPONIBILITE	OBSERVATIONS SUR LE CONTROLE
1	Marché signé +ordre de service	Délai - Conformité avec le CPTP	oui	Bon suivi
2	Devis estimatif et Quantitatif	Description des prestations - Quantité - Prix	oui	Bon suivi
3	Plans d'exécution Détaillée approuvés par l'Ingénieur Conseils	Cachet d'approbation		
4	Test de laboratoire et autres	Conformité avec les Normes	oui	Bon suivi
5	PV contrôle et Réception d'ouvrage par Bureau de Contrôle	-Conformité réalisation avec les plans et prescriptions	oui	Bon suivi
6	PV réunion de chantier	-Respect des dispositions du marché	oui	Bon suivi

#### 6.4.3. Synthèse des constats et conclusion

En somme, on peut retenir que ce marché a été exécuté à 100% dans le respect des règles de l'art (le choix des matériaux et la mise en œuvre). Les réceptions provisoire et définitive ont été faites dans le respect de délai de garantie.

## 6.5. DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE DE MARADI

### 6.5.1. Consistance des travaux du marché

L'audit technique pour cette autorité contractante a porté sur deux marchés ci-après :

- ✓ **Marché n° : 001/PC/DRH/BIE/2013 : Réalisation de quinze(15) puits cimentés dans la Région de Maradi**
- ✓ **Marché n° :001/AEP/DRH/BIE/2013 : Réalisation de deux(2) muni-AEP multi-villages dans le département d'Aguié et Tessaoua Région de Maradi**

**Marché n°: 001/PC/DRH/BIE/2013 :**

Dans le présent marché seul le lot 6 a fait l'objet d'audit de matérialité qui consiste a la réalisation de trois(3) puits cimentés au niveau des villages de Talbaibrahim, Barmosajé et ZangonAgazaran département de Dakoro .

<b><u>Maitre d'ouvrage</u></b>	Gouvernorat de Maradi
<b><u>Maitre d'œuvre</u></b>	Direction Régionale de l'Hydraulique de Maradi
<b><u>Attributaire</u></b>	HYDRO.BAT
<b><u>Montant</u></b>	41 834 450 F TTC
<b><u>Délai d'exécution :</u></b>	7 mois
<b>Les composantes des travaux</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Mobilisation/démobilisation de tout le personnel et de tout le matériel</li> <li>❖ Travaux de fonçage</li> <li>❖ Equipement (cuvelage en diamètre de 1,80m, pose de buse , pose dalle de fond)</li> <li>❖ Superstructures Aménagement de surface Construction d'une margelle en BA</li> <li>❖ Développement au cuffat</li> <li>❖ Pompage à l'essai</li> <li>❖ Analyse physico-chimique</li> <li>❖ Traitement à l'hypochitonite</li> </ul>

**Marché n° :001/AEP/DRH/BIE/2013 :**

Dans le présent marché seul le lot1 relatif aux travaux de la réalisation d'un AEP multi-villages du département d'Aguié a fait l'objet de l'audit de matérialité.



## ➤ Réseau d'adduction (refoulement).

**Maitre d'ouvrage**

Gouvernorat de Maradi

**Maitre d'œuvre**

Direction Régionale de l'Hydraulique de Maradi

**Attributaire**

SAUKI MURNA

**Montant****194 606 650 F TTC****Délai d'exécution :**

5 mois

**Les composantes des travaux**

- ❖ Implantation/Repli
- ❖ Tête de forage
- ❖ Electropompe immergé
- ❖ Groupe électrogène
- ❖ Château d'eau
- ❖ Réseau de distribution

**6.5.2. Constats****6.5.2.1. Matérialités des dépenses effectuées**

L'examen a porté sur les travaux de réalisation de trois puits cimentés au niveau des villages de Talba Ibrahim, Barmo Saje, et Zangon Agazaran département de Dakoro et la réalisation d'un AEP multi-villages dans le département d'Aguié. La partie exécutée des travaux et auditée par le consultant se décompose de la manière suivante :

N°	Désignation du marché	Montant du marché	Partie exécutée du marché	Travaux complémentaires	Travaux Total exécutés
1	Realisation de trois puits cimentés au niveau des villages du departement Dakoro	35 155 000	30 990 000		30 990 000
2	Réalisation d' un AEP multi-village dans le departement d'aguié	163 535 000	83 223 750		83 223 750
	<b>TOTAL HT</b>	<b>198 690 000</b>	<b>114 213 750</b>	-	<b>114 213 750</b>

Les détails indiquant les quantités de travaux nécessaires et celles prévues au marché sont présentés en annexes.

### 6.5.2.2. Etat des ouvrages

Pour le marché de la réalisation de trois(3) puits cimentés dans le département Dakoro le taux d'exécution des travaux est à 88%. Nous avons trouvé le chantier en cours d'exécution. Voici les constats faits :

- ❖ Mise en eau en cours mais absence du conducteur du derrick
- ❖ 4 buses déjà mise en place
- ❖ 2 tonnes de ciment trouvées sur place
- ❖ L'équipe de puisatier de 5 personnes
- ❖ Attente du briquetier

Niveau du puits atteint : NDB : 45,5m

NS : 46,40M

PT : 47,30m

- ❖ Sur les trois puits, les travaux sont toujours en cours donc il n y a eu aucune réception.

Problèmes techniques constatés :

- ❖ Manque des personnels suffisants et qualifiés pour le travail sur le terrain
- ❖ Manque de contrôle permanent de mission de contrôle assuré par la direction faute de moyen financier pour le contrôle.

**L'état des ouvrages se présente comme suit :**



**Puits village AZAGOR**



**Buses pour la mise en eau**



**Puits talba Ibrahim**



**Puits Bermosajé**



**Buses pour les puits talba Ibrahim**



**Buses pour le puits**

### **Bermo sajé**

Pour le marché de réalisation de l'AEP multi-villages dans le département d'Aguié : l'exécution des travaux sont à un taux de 50,89%. Voici l'état et les constats des travaux sur le terrain :

- tête de forage achevée

- Pose de château d'eau (100m<sup>3</sup>) non achevée
- Présence de réservoir déposé au sol sur le site
- Travaux du réseau de distribution toujours en cours (fouille et pose de conduite)
- Travaux d'adduction (construction et équipement des bornes fontaines sont à 70%).

La photographie de l'état du chantier ainsi que suit :



**Réservoir (100m<sup>3</sup>) posé au sol sur la fondation du château**



**Tête de forage**

**borne fontaine**



**Intérieur du BF non équipé Regard de borne fontaine**



**Partie de Conduite enterrée Pose de la conduite**



**Mauvaise pose de la conduite Enterrement de la conduite en cours**

#### 6.5.2.3. Conformité des ouvrages par rapport aux normes techniques

- Pour les travaux de réalisation de trois puits cimentés dans les villages du département de Dakoro, l'audit a constaté que les travaux sont exécutés conformément aux normes techniques prévues dans les CPT.
- Pour les travaux de réalisation d'un AEP multi-villages dans le département d'Aguié, l'audit a relevé les insuffisances ci-après :

##### Problèmes techniques observés :

- Le non-respect du dosage des matériaux comme prévu par les normes dans le CPT ;
- Le coffrage des bornes fontaines sont mal fait ;
- Les fouilles sont mal exécutées ;
- Le regard des bornes fontaines sont mal fait ;
- La pose de conduite mal fait (emboitement).

#### 6.5.2.4. Conformité de réception des ouvrages dans le délai de garantie

Aucune réception n'a été faite, les travaux sont toujours en cours d'exécution

### 6.5.2.5. Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par rapport aux consultations

Pour le marché de réalisation de trois (03) puits cimentés dans les villages talba Ibrahim, Azagor et Bermosajé dans le département de Dakoro.

N°	DOCUMENT DE CONTROLE	NATURE DU CONTROLE	DISPONIBILITE	OBSERVATIONS SUR LE CONTROLE
1	Marché signé +ordre de service	Délai - Conformité avec le CPTP	Oui	Bon suivi
2	Devis estimatif et Quantitatif	Description des prestations - Quantité - Prix	Oui	Bon suivi
3	Plans d'exécution Détaillée approuvés par l'Ingénieur Conseils	Cachet d'approbation	Oui	Bon suivi
4	Test de laboratoire et autres	Conformité avec les Normes	Oui	Bon suivi
5	PV contrôle et Réception d'ouvrage par Bureau de Contrôle	-Conformité réalisation avec les plans et Prescriptions	Oui	Bon suivi
6	PV réunion de chantier	-Respect des dispositions du marché	Non	Manque de suivi permanent

#### **Observations**

A ce niveau l'audit a relevé le manque de suivi permanent des travaux. Il ressort des explications fournies, que c'est le manque des moyens financiers qui est à l'origine de cette situation.

- Pour les travaux de réalisation d'un AEP multi-villages dans le département d'Aguié,

N°	DOCUMENT DE CONTROLE	NATURE DU CONTROLE	DISPONIBILITE	OBSERVATIONS SUR LE CONTROLE
1	Marché signé +ordre de service	Délai - Conformité avec le CPTP	Oui	mal suivi
2	Devis estimatif et Quantitatif	Description des prestations - Quantité - Prix	Oui	Bon suivi
3	Plans d'exécution Détaillée approuvés par l'Ingénieur Conseils	Cachet d'approbation	Oui	Bon suivi
4	Test de laboratoire et autres	Conformité avec les Normes	Oui	Mal suivi
5	PV contrôle et Réception d'ouvrage par Bureau de Contrôle	-Conformité réalisation avec les plans et prescriptions	Oui	Bon suivi
6	PV réunion de chantier	-Respect des dispositions du marché	Non	Manque de suivi permanent

### **Observations**

A ce niveau l'audit a relevé le manque de suivi permanent des travaux. Il ressort des explications fournies, que c'est le manque des moyens financiers qui est à l'origine de cette situation.

### **6.5.3. Synthèse des constats et conclusion**

En somme, l'audit a noté que les travaux sont toujours en cours. Des retards énormes ont été constatés. Cela est dû au manque de présence permanente de mission de contrôle et au manque des moyens financiers pour le suivie.

Pour les travaux des puits ciment nous n'avons pas relevé d'irrégularités.

Par contre, en ce qui concerne le chantier de muni-AEP, les normes techniques n'ont pas été respectés au vu des observations faites sur le terrain.

## 6.6. DIRECTION REGIONALE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES DE MARADI

### 6.6.1. Consistance des travaux du marché

L'audit technique pour cette autorité contractante a porté sur un seul marché ci-après :

- ✓ **Marché n° :46/2013/RG/DREMS/MI** : Travaux de construction de 14 salles des classes aux CES BAGALAM et JUINGUILE dans la ville de Maradi

<b>Maitre d'ouvrage</b>	Gouvernorat de Maradi
<b>Maitre d'œuvre</b>	Direction Régionale d'enseignements secondaires de Maradi
<b>Attributaire</b>	Entreprise Moussa Tanko
<b>Montant</b>	<b>14 061 936 F TTC</b>
<b>Délai d'exécution :</b>	4 mois
<b>Les composantes des travaux</b>	construction de deux blocs des classes au CES BAGALAM

### 6.6.2. Constats

#### 6.6.2.1. Matérialités des dépenses effectuées

L'examen a porté sur les travaux de construction de deux blocs des classes au CES BAGALAM. La partie exécutée des travaux et auditée par le consultant se décompose de la manière suivante :

N°	Désignation du marché	Montant du marché	Partie exécutée du marché	Travaux complémentaires	Travaux confortatifs	Travaux Total exécutés
1	Construction d deux blocs des classes au CES BAGALAM	11 787 233	11 787 233			11 787 233
	<b>TOTAL HT</b>	<b>11 787 233</b>	<b>11 787 233</b>	-	-	<b>11 787 233</b>

Les détails indiquant les quantités de travaux nécessaires et celles prévues au marché sont présentés en annexes.

#### 6.6.2.2. Etat des ouvrages

Les travaux sont exécutés à 100%, la réception provisoire a déjà eu lieu.



On a trouvé le chantier en état de correction des malfaçons constatés lors de réception provisoire.

Voici l'état de chantier photographié :



La Façade principale de deux blocs des salles des classes  
BAGALAM

CES



Façade Arrière



le tableau

### 6.6.2.3. Conformité des ouvrages par rapport aux normes techniques

Les majeures parties des travaux ont été réalisés dans le respect des normes techniques comme prévu dans les cahiers des prescriptions techniques. Néanmoins on a observé des malfaçons dans l'ouvrage:

- ✓ Problème d'étanchéité de toiture.
- ✓ Problème de tableau (ardoisine et la chape mal fait).

### 6.6.2.4. Conformité de réception des ouvrages dans le délai de garantie

Les travaux ont été réceptionnés provisoirement. Mais la réception définitive est en attente

### 6.6.2.5. Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par rapport aux consultations

N°	DOCUMENT DE CONTROLE	NATURE DU CONTROLE	DISPONIBILITE	OBSERVATIONS SUR LE CONTROLE
1	Marché signé + ordre de service	Délai - Conformité avec le CPTP	Oui	Bon suivi
2	Devis estimatif et Quantitatif	Description des prestations - Quantité - Prix	Oui	Bon suivi
3	Plans d'exécution Détaillée approuvés par l'Ingénieur Conseils	Cachet d'approbation	Oui	Bon suivi
4	Test de laboratoire et autres	Conformité avec les Normes	Oui	Bon suivi
5	PV contrôle et Réception d'ouvrage par Bureau de Contrôle	-Conformité réalisation avec les plans et Prescriptions	Oui	Bon suivi
6	PV réunion de chantier	-Respect des dispositions du marché	Oui	Insuffisance vu le problème de la toiture

### 6.6.3. Synthèse des constats et conclusion

Le marché examiné consiste à la réalisation de deux blocs de classes au CES BAGALAM. Ainsi ces travaux sont exécutés à 100% dans le respect des règles de l'art. Néanmoins on a constaté des problèmes de mise œuvre de la toiture de l'ouvrage.

Niamey, le 28 août 2015



**Serge MENSAH**  
Associé-Gérant  
Expert en passation des marchés  
Expert-comptable diplômé  
Commissaire aux comptes

## VII. ANNEXES

## ANNEXE 1 : LISTE DES PERSONNES RENCONTREES

N° d'ordre	Noms	Fonction
1	Amadou Ango	Directeur de l'urbanisme de Dosso
2	Abba Nakoira Mahamadou Bachirou	Directeur de l'équipement de Dosso
3	Ibrahim Zakaria	Directeur de l'hydraulique de Dosso
4	Mahamadou Mainnassara	Financier direction de l'éducation Dosso
5	Boubacar MaggagiDandinkowa	Directeur de l'hydraulique de Maradi
6	Illo BIJA	Directeur des enseignements secondaires Maradi

## ANNEXE 2 : ECHANTILLON

ECHANTILLON POUR L'AUDIT DE MATERIALITE SUR L'EXECUTION PHYSIQUE DES MARCHES DE LA REGION DE DOSSO-MARADI

N° d'ordre	N° d'appel d'offres	N° Lot	Objet	Type de marché	Structure	Titulaire	Montant adjudication	Mode de passation	Financement	Région	Tranche
1	03/13/GRD/DRUL	1	Réhabilitation Gouvernorat	Travaux	DRUL/DO	HYBAT	46 792 454	Appel d'Offres Restreint	Budget National	DOSSO	2
2	01/2013/GRD/DRUL	1	Construction des Bureaux et services	Travaux	DRUL/DO	Issoufou Abdou	48 709 971	Appel d'Offres Restreint	BN	DOSSO	2
3	2013/013/G/DREQ/DO	4	Travaux entretien courant campagne 2014	Travaux	DREQ/DO	Amadou Seyni	44 084 026	Appel d'Offres Restreint	CAFER	DOSSO	2
4	02/2013/GD/DRH/DO	2	Réhabilitation mini-AEP	Travaux	DRH/DO	Touthydro SA	260 663 911	Appel d'Offres National	Budget National	DOSSO	3
5	013/2013/RC/DRES/MI	3	Construction de 14 salles de classes	Travaux	DRES/MI	Moussa Tanko	14 061 936	Appel d'Offres National	BN	MARADI	1
6	001/PC/DRH/BIE/2013 Réhabilitation de 15 puits cimentés	6	Réhabilitation de 15 puits cimentés	Travaux	DRH	Entreprise Hydroba	41 834 200	Appel d'Offres National	BN	MARADI	2
7	01/2013/Gouv/DREN-DO	6	Construction de 300 classes	Travaux	DREN/DO	Oumarou Ango et Frères	346 748 741	Appel d'Offres National	Budget National	DOSSO	3
8	001/AEP/DRH/BIE/2013 Travaux de réalisation de deux mini-AEP muti-village thermiques	1	Travaux de réalisation de deux mini-AEP muti-village thermiques	Travaux	DRH	Entreprise Sauki Murna	194 606 650	Appel d'Offres National	BN	MARADI	3
